

## 2025年1月 工事進捗報告




南側から

- ・ 12月から始まった杭工事は順調に進み、東側から雨水貯留槽の掘削工事を開始しました。
- ・ 水路を新設する工事を開始しました。



東側から

- ・ 基礎、杭工事を施工中です。

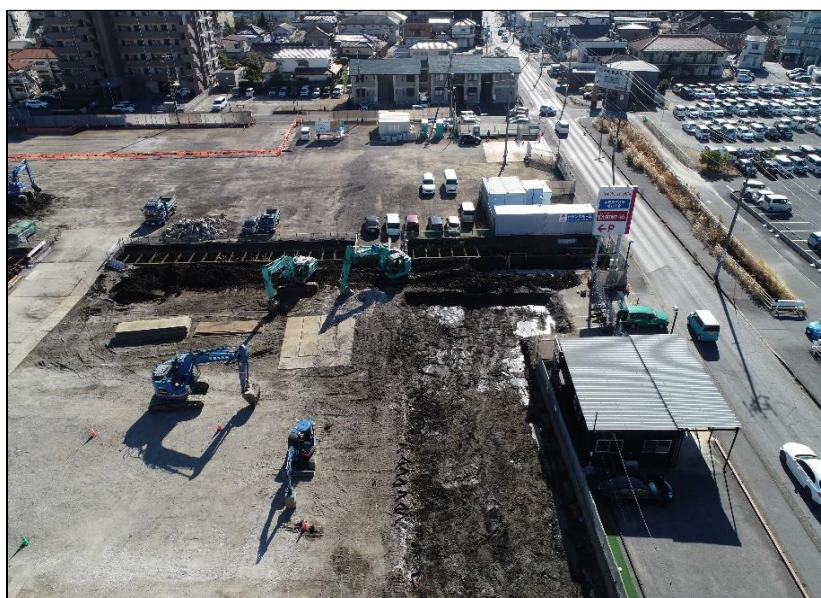

北側から

- ・ 雨水貯留槽を設置するための掘削を開始しました。
- ・ 雨水貯留槽設置の施工にあたり、排水をする必要があるため、排水設備を準備の上、排水を開始しました。

## 2025年1月 工事進捗報告



西側から

- ・水路を新設するため、迂回水路の掘削を開始しました。
- ・外周仮囲いの整備が完了しました。



場内①（水路）

- ・既存水路の北側に仮設の迂回水路を設けるため、既存水路の撤去作業を開始しました。



場内②（建屋）

- ・建屋の基礎を作るため、地面を掘削し、碎石を敷き詰め、その上から圧力をかけて締め固める作業を開始しました。
