


2025年4月 工事進捗報告



南側から

- ・基礎工事と並行して鉄骨工事を開始しました。
- ・南側については、埋戻しまで完了しました。
- ・西側については、雨水貯留槽の設置に向け、基礎工事が完了しました。

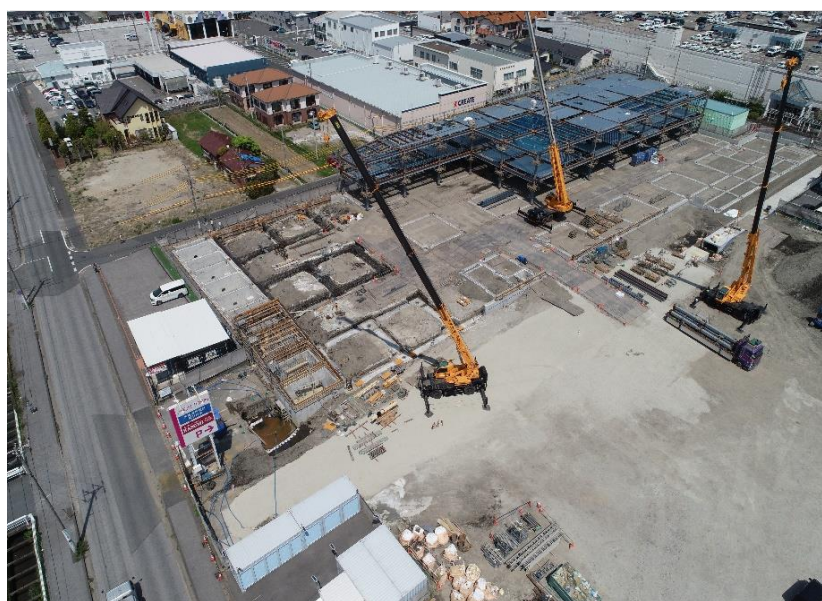

東側（上空）

- ・建屋の鉄骨工事を開始しました。
- ・鉄骨の接合部を固定した後に、建物の床や屋根の構造を作るために必要な鋼製のプレート（デッキプレート）の設置作業を行っています。



北側（上空）

- ・雨水貯留槽を設置するための基礎コンクリート打設が完了しました。

2025年4月 工事進捗報告



西側から

- ・新設水路用のボックスカルバートの敷設がほぼ完了しました。
- ・水路周囲の埋戻しもほぼ完了しました。



場内①（水路）

- ・ボックスカルバートの敷設作業中です。



場内②（建屋）

- ・建屋の鉄骨組み立て作業を行っています。
- ・水路の埋戻し作業を行っています。
