

2025年7月 工事進捗報告



南側から

- ・コンクリート工事がほぼ完了しました。
- ・外壁工事は、北面、東面から施工しています。
- ・内部では、軽量間仕切り、天井下地、鋼製建具取付、壁ボードの施工を行っています。
- ・8月中旬頃から壁のクロス貼り工事を予定しています。



東側（上空）


- ・屋上階の床に防水材を塗布して内部に浸透させることで、水の侵入を防ぐ施工を進めています。



西側から

- ・2階の室外機置場の建築設備などを安全かつ安定的に設置するための基礎コンクリート打設が完了しました。

2025年7月 工事進捗報告

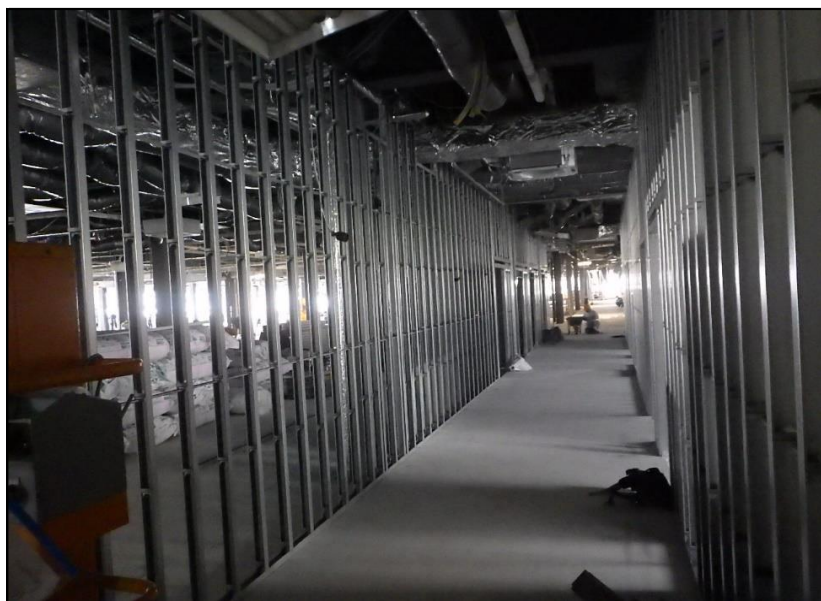

場内①（建屋）

- ・ 壁の仕上げ材を取り付ける前に行う壁の骨組みや支持構造を作る作業を進めています。



場内②（建屋）

- ・ 天井の仕上げ材を取り付けるための骨組み構造を作る作業を進めて居います。



場内③（建屋）

- ・ 建物内で火災の延焼を防ぐために設けられる防火区画の開口部に防火シャッターを取り付けています。
