


## 2025年8月 工事進捗報告



### 南側から

- ・ 南面、西面の外装工事を進めながら、内部では内装工事を進めています。
- ・ 北面から外部足場の解体工事を進めています。
- ・ 外構工事については、車が円滑に出入りできるよう、乗り入れ口の工事を進めています。

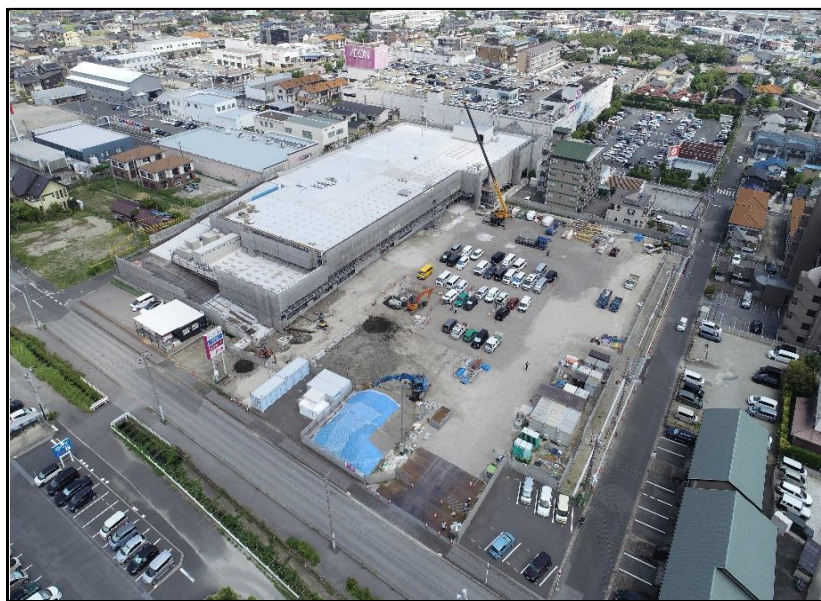

### 外部（南面）

- ・ 建物の外壁にサイディング（板状の仕上げ材）を張る施工を進めています。



### 駐車場エリア（南側）

- ・ 敷地南東部において、乗り入れ口の整備を進めています。
- ・ 駐車場の舗装の下地をつくる砕石路盤施工を進めています。

## 2025年8月 工事進捗報告



場内①（建屋）

- ・2階（執務エリア）において、壁の表面にビニール製の壁紙（ビニルクロス貼り）を貼る作業を進めています。
- ・ビニルクロスを貼る前に壁の表面を整える下地施工を行っています。



場内②（建屋）

- ・2階（サーバー室）については、ビニルクロス貼り作業が完了しました。



場内③（建屋）

- ・2階（執務エリア）において、天井の下地に石膏ボードなどを貼り付ける作業を進めています。
