


# 朝日新庁舎工事進捗状況について

資料2

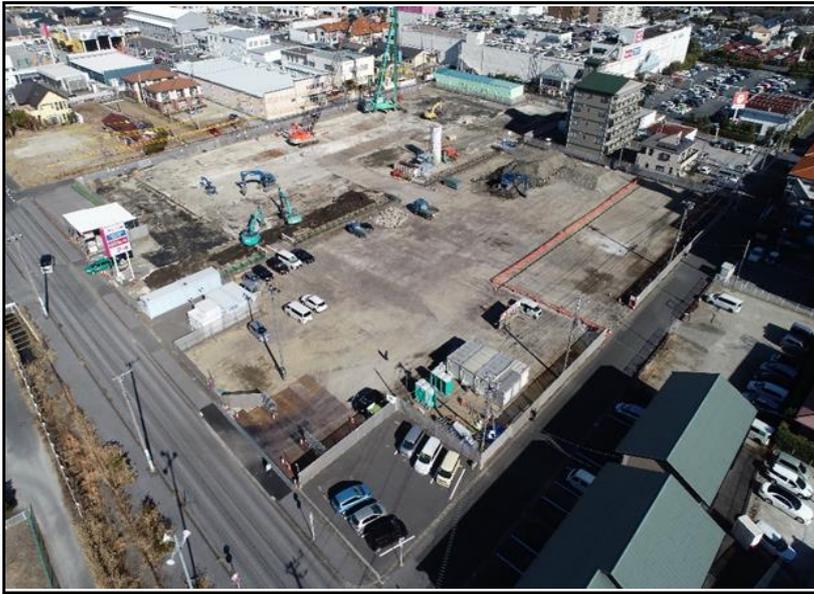

令和7年1月

- ・12月から始まった杭工事は順調に進み、東側から雨水貯留槽の掘削工事を開始しました。
- ・水路を新設する工事を開始しました。



令和7年2月

- ・建物の杭工事が完了し、本格的な基礎工事が始まりました。
- ・建物東側から掘削・配筋・型枠工事を開始しました。




令和7年3月

- ・建物北側の一部については、基礎コンクリート打設が完了し、4月からの鉄骨工事に向けて埋戻し作業中です。
- ・南側については、引き続き基礎工事作業中です。

# 朝日新庁舎工事進捗状況について

資料2

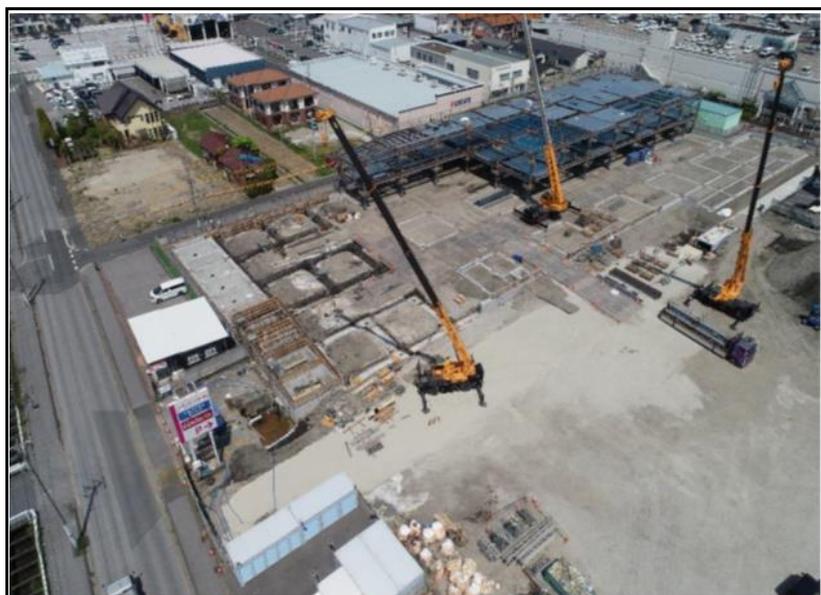

令和7年4月

- ・基礎工事と並行して鉄骨工事を開始しました。
- ・南側については、埋戻しまで完了しました。
- ・西側については、雨水貯留槽の設置に向け、基礎工事が完了しました。



令和7年5月

- ・4月7日から開始した鉄骨工事は順調に進み、建物の骨組みを組み立てる作業が完了しました。
- ・床コンクリートを打設する前のデッキプレート（鋼製床材）を敷設する作業を進めています。
- ・鉄骨梁とコンクリートスラブを一体化させる作業を進めています。



令和7年6月

- ・鉄骨工事が完了しました。
- ・各階の床部分に鉄筋を配置する作業とコンクリート打設を行いながら、天井内の配線・配管工事を進めています。
- ・外部では、外壁サッシの取付や外壁板の施工を開始します。
- ・内部では、軽量鉄骨間仕切り工事が始まります。

# 朝日新庁舎工事進捗状況について

資料2



令和7年7月

- ・コンクリート工事がほぼ完了しました。
- ・外壁工事は、北面、東面から施工しています。
- ・内部では、軽量間仕切り、天井下地、鋼製建具取付、壁ボードの施工を行っています。
- ・8月中旬頃から壁のクロス貼り工事を予定しています。



令和7年8月

- ・南面、西面の外装工事を進めながら、内部では内装工事を進めています。
- ・北面から外部足場の解体工事を進めています。
- ・外構工事については、車が円滑に出入りできるよう、乗り入れ口の工事を進めています。
