

新火葬場整備工事用道路 に係る住民説明会



平成29年11月8日

木更津市 環境部 火葬場建設準備室

本日説明する内容



- 1. はじめに（これまでの経緯）
- 2. 工事用道路（羽鳥野ルート）について
- 3. 新火葬場周辺道路整備計画について

1.はじめに（これまでの経緯）

1. 平成33年12月の新火葬場供用開始に向け、（仮称）木更津市火葬場整備運営事業に係る造成・建設工事期間中の工事関係車両の進入路として、国道127号波岡交差点を南下した君津市北子安からの仮設道路（君津ルート）を利用する計画でした。
2. 本年7月に君津ルートの地権者を訪問し、土地利用目的等の事業概要を説明しました。（訪問先 法人9・個人6・官公庁2）
3. 工事用道路用地等立入承諾書を全地権者から受理したうえで、本年9月から調査・設計業務を実施する予定でした。

4. しかし、本事業での用地利用に難色の立場をとる地権者が一部存在したため、別ルート of 確保を検討することになりました。
5. 内部で慎重に検討した結果、現在羽鳥野でストップしている都市計画道路（大久保畑沢線）の一部を利用する羽鳥野ルートの検討に入りました。
6. 羽鳥野ルートについては、都市計画道路を羽鳥野から林道宮内線まで延伸させるもので、土地2筆を跨ぐルートとして地権者が少ないため、比較的容易であると判断しました。（地権者 法人1・個人1）
7. 9月18日及び10月13日に、それぞれの地権者を訪問し、土地利用目的等の事業概要を説明し、概ね事業への理解をいただいているところです。

新火葬場周辺市道及び工事用道路の位置図

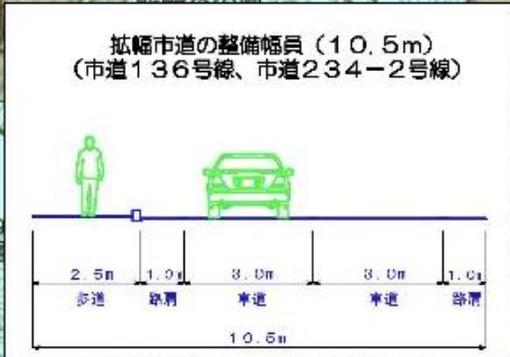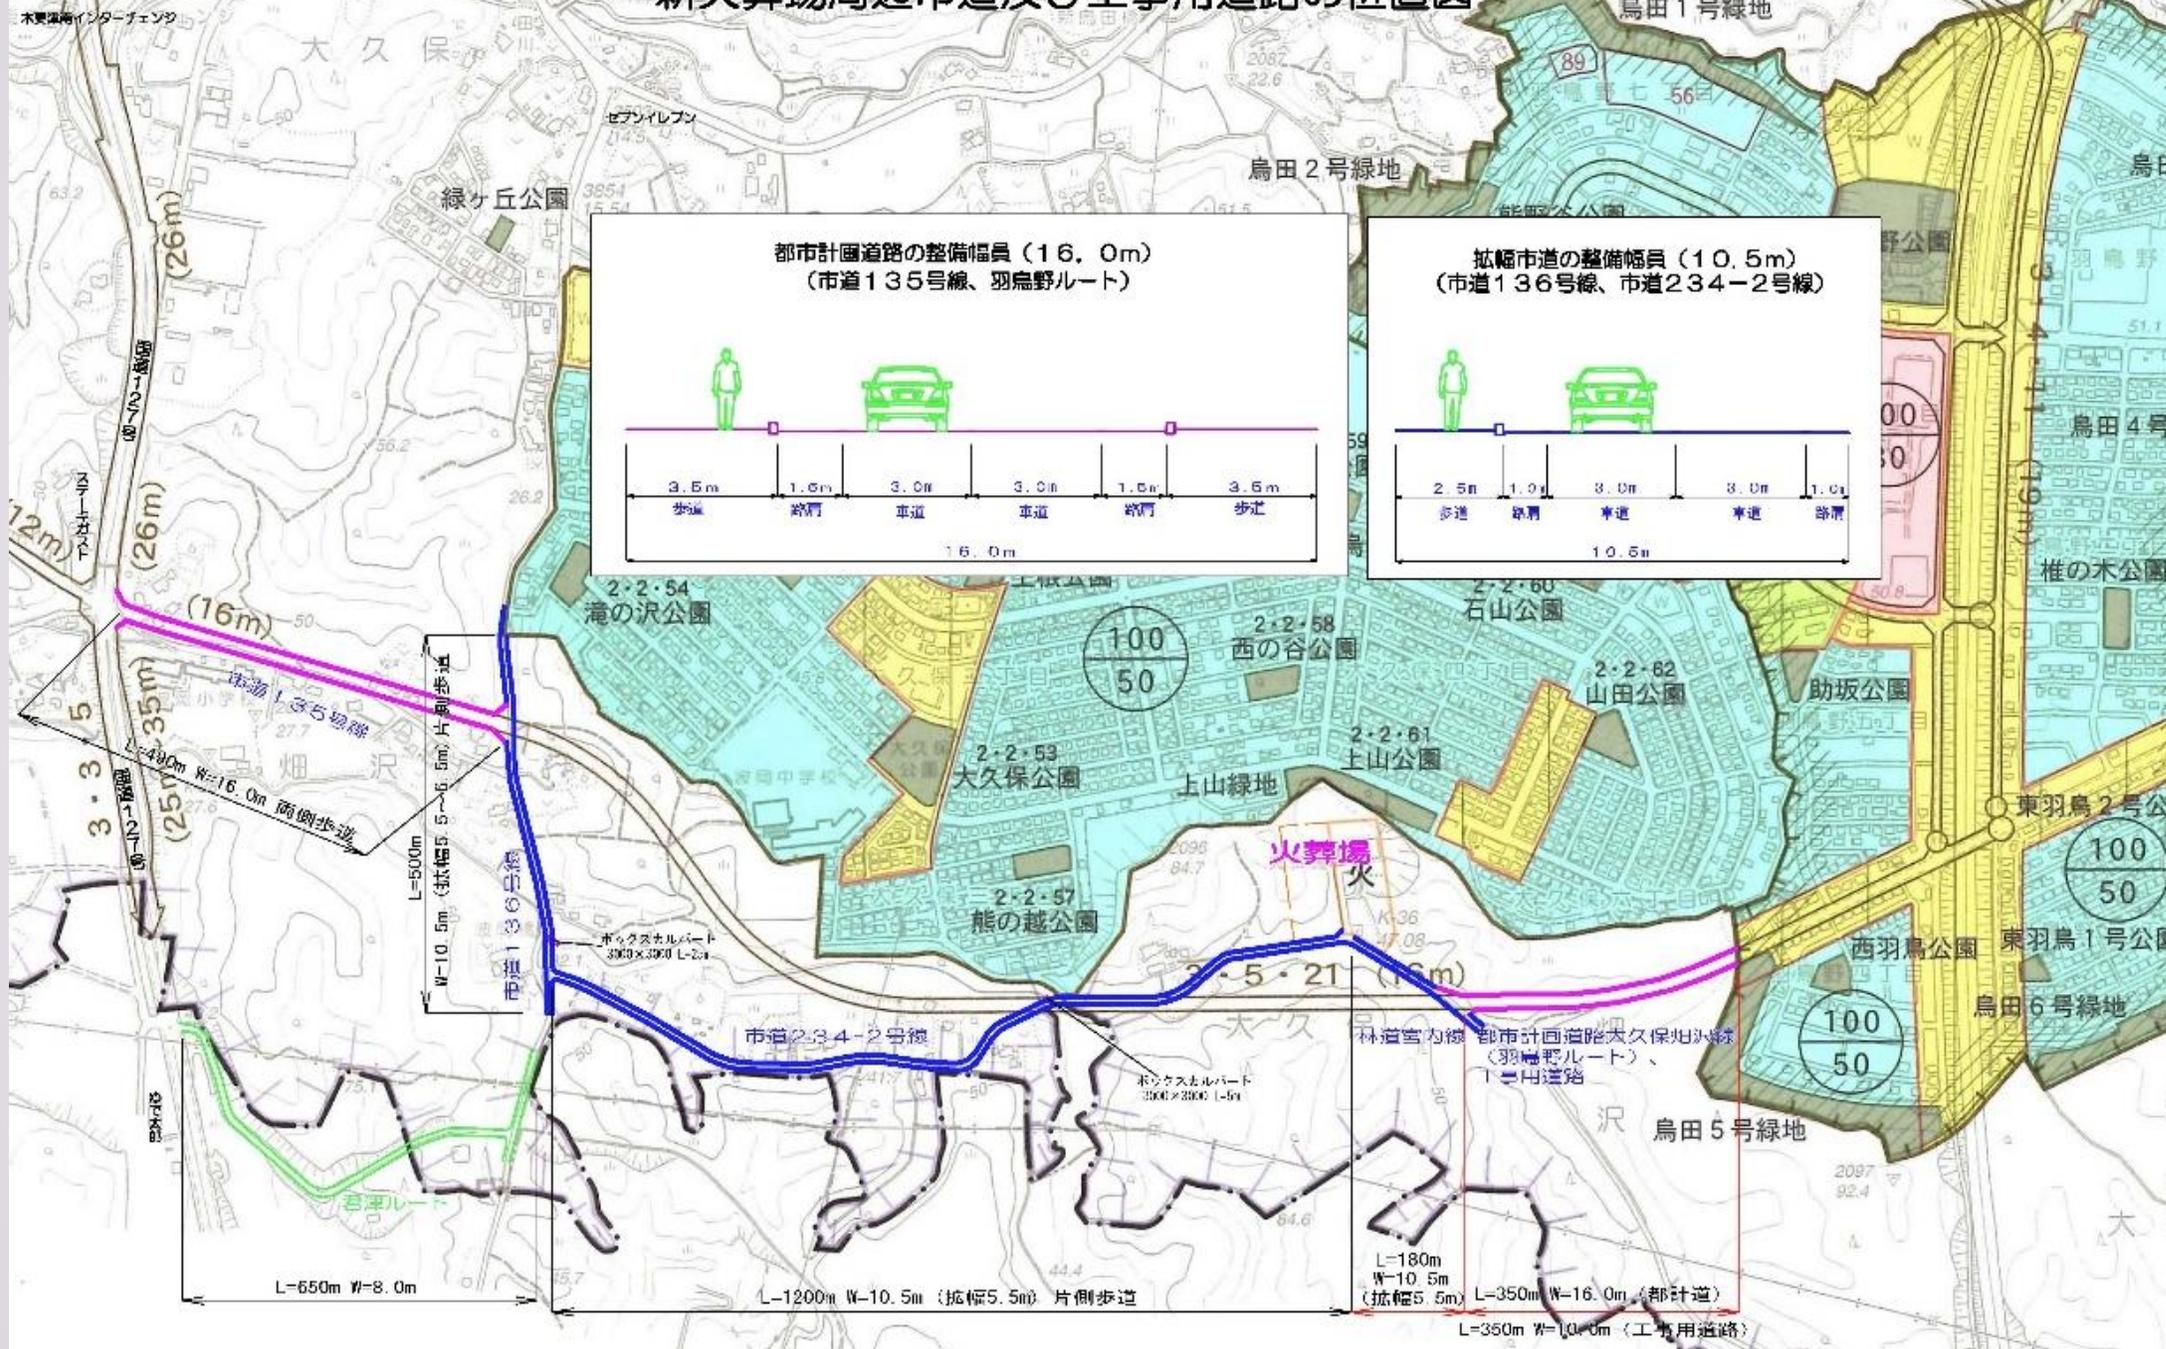

市道135号線
L=500m (拡幅5.5~6.5m) 片側歩道
W=10.5m

市道136号線
L=1200m W=10.5m (拡幅5.5m) 片側歩道

市道234-2号線
L=180m W=10.5m (拡幅5.5m)

市道234-2号線
L=350m W=16.0m (都市計画)

工事用道路
L=350m W=10.0m (工事用道路)

市道135号線
L=650m W=8.0m

市道135号線
L=490m W=16.0m 両側歩道

市道135号線
L=120m W=16.0m

2. 工事用道路（羽鳥野ルート）について

1. 新火葬場施設の供用開始までの羽鳥野ルート利用スケジュールとしては、平成31年4月から6月まで仮設での工事用道路建設、同年7月から12月まで新火葬場区域の造成工事、平成32年1月から平成33年9月まで施設建設工事を行い、平成33年12月の供用開始までの利用を予定しています。
2. 新火葬場施設の供用開始後、現火葬場の解体撤去工事や駐車場整備に係る工事用道路として、平成34年5月までの利用を予定しています。
3. すべての新火葬場整備工事が終わる平成34年6月からは、周辺市道整備事業の対象路線となっている市道234-2号線（平成32年度整備計画）、136号線（平成33年度整備計画）及び135号線（平成34年度整備計画）の3路線の整備状況に応じ、都市計画道路として整備する予定です。

■ 羽鳥野ルート整備のながれ

工事用仮設道路調査・設計業務

平成29年12月～平成30年6月

現況・路線測量業務

平成30年1月～平成30年4月

実施設計業務

平成30年4月～平成30年11月

用地測量・不動産鑑定・物件調査

平成30年8月～平成31年5月

用地取得

平成30年12月～平成31年5月

工事用仮設道路工事

平成31年4月～平成31年6月

工事用仮設道路利用

平成31年7月～平成34年5月

都市計画道路（羽鳥野ルート）工事

平成34年6月～


3.新火葬場周辺市道整備計画について

■ 周辺市道整備のながれ（工事期間）


H33.12新火葬場供用開始

	H31年度	H32年度	H33年度	H34年度	H35年度
工事用仮設道路	■				
市道234-2号線		■			
市道136号線			■		
市道135号線				■	
都市計画道路 (羽鳥野ルート)				■	■


新火葬場周辺市道及び工事用道路の位置図

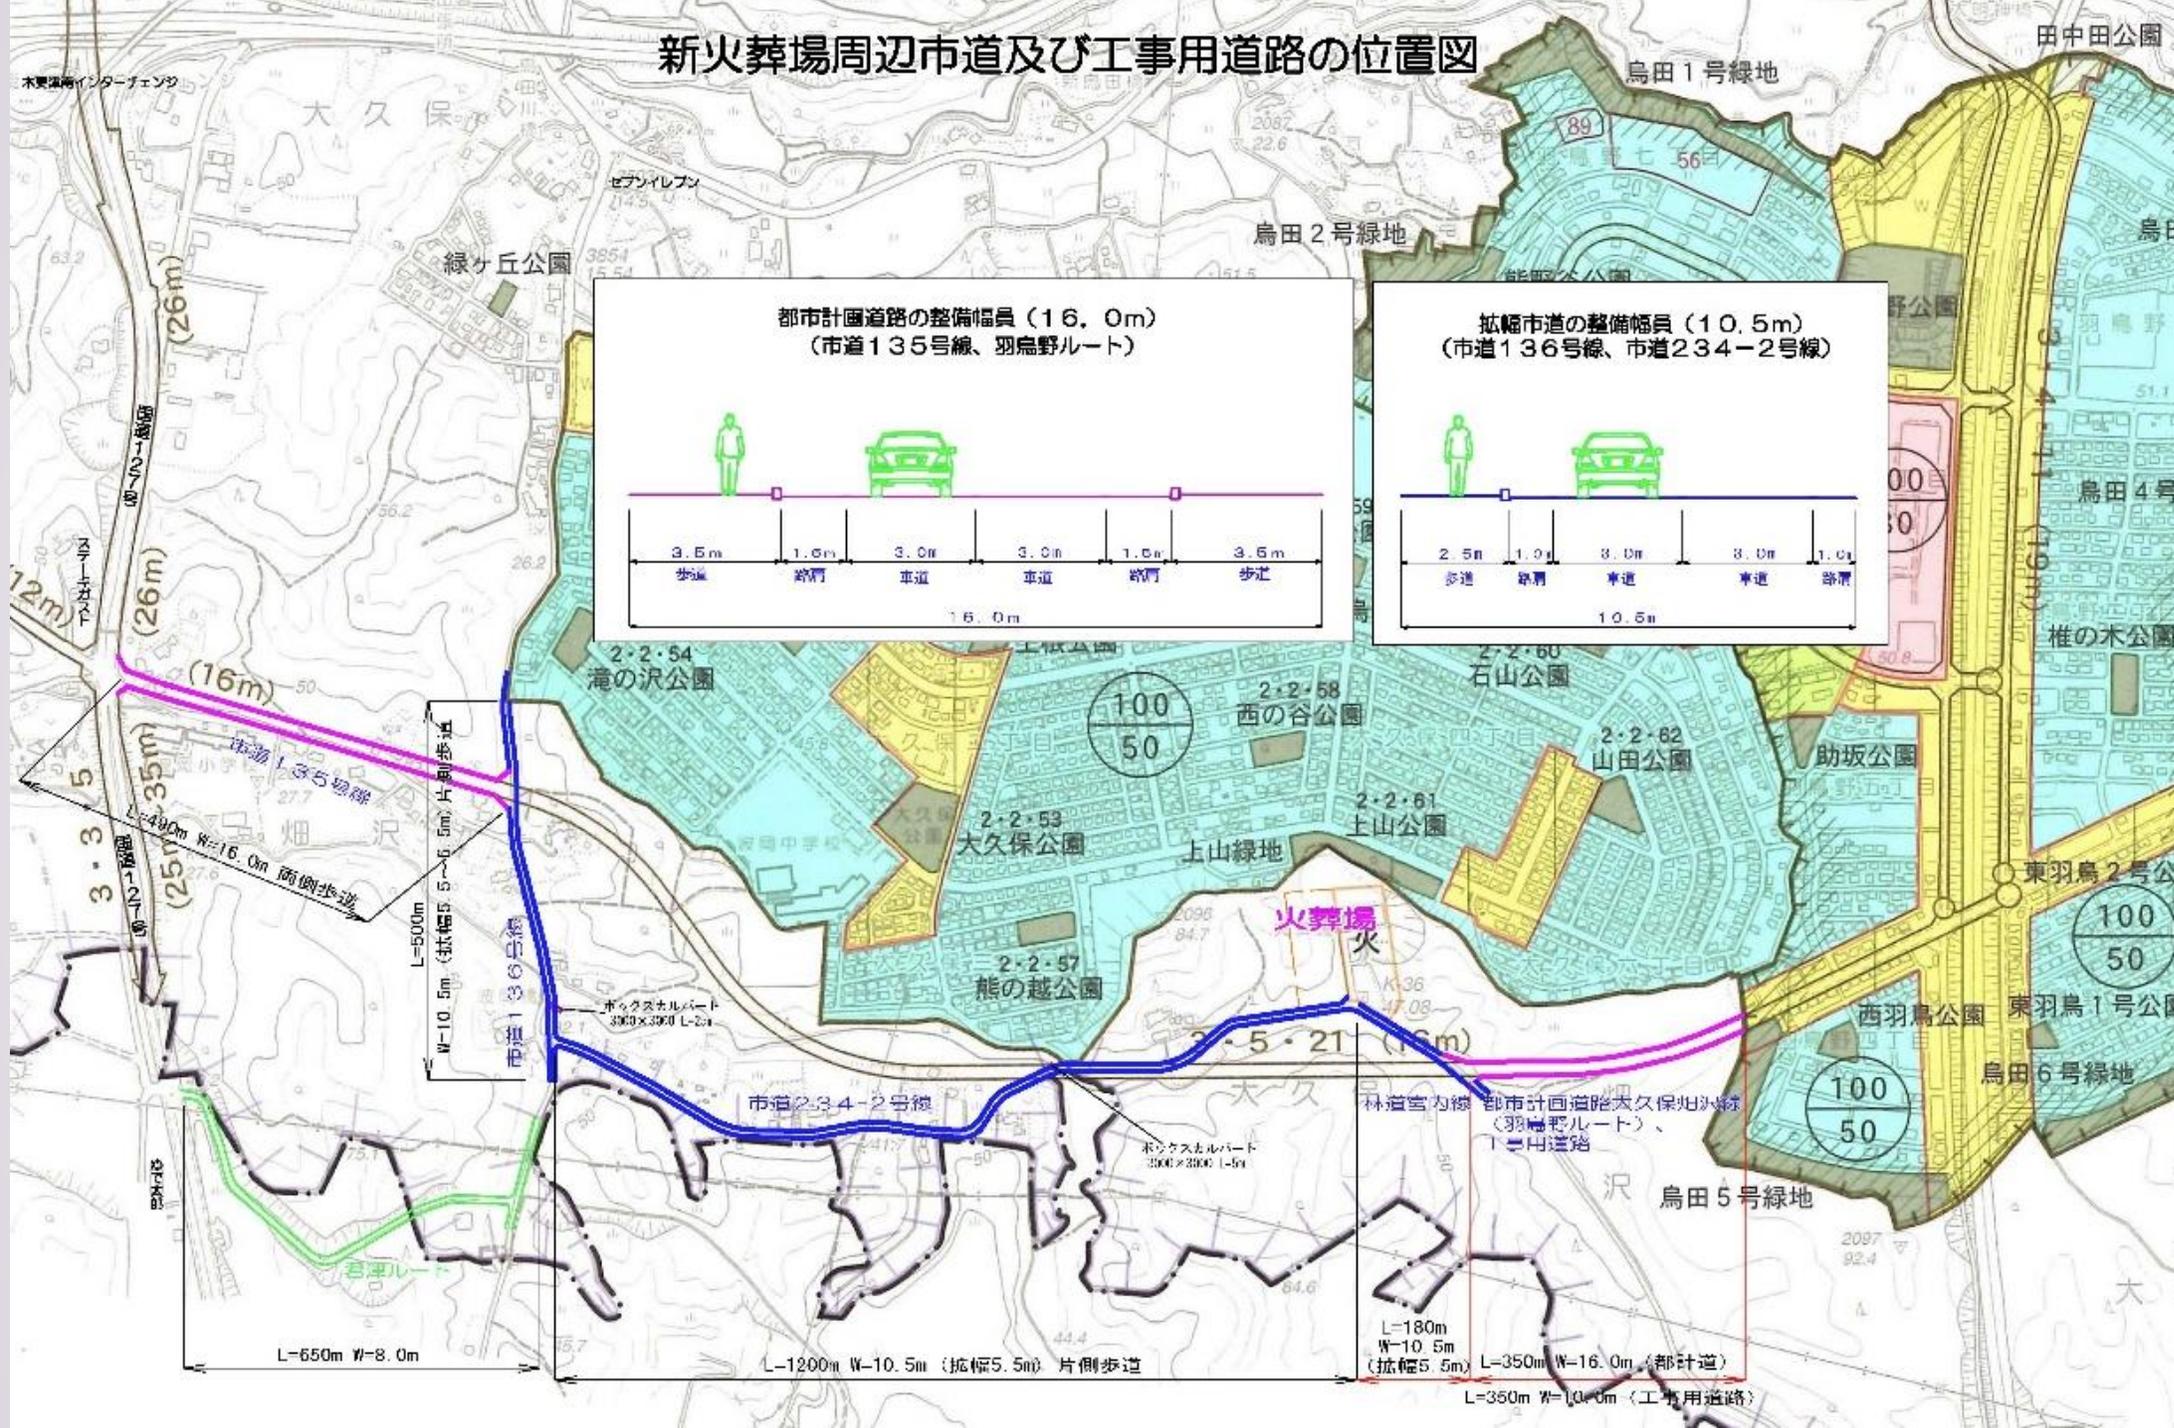

都市計画道路の整備幅員 (16.0m)
(市道135号線、羽鳥野ルート)



拡幅市道の整備幅員 (10.5m)
(市道136号線、市道234-2号線)



市道135号線
L=490m W=16.0m 両側歩道
L=500m
W=10.5m (拡幅5.5m) 片側歩道
L=650m W=8.0m

市道234-2号線
L=1200m W=10.5m (拡幅5.5m) 片側歩道

市道234-2号線 (L=180m W=10.5m (拡幅5.5m))
L=350m W=16.0m (都市計画)
L=350m W=10.0m (工事用道路)

火葬場

100
50
100
50

【現況写真】



①市道135号線(波岡小学校前)



②市道135号線



③市道136号線



④市道136号線



⑤市道234-2号線



⑥市道234-2号線

【整備後イメージ写真】



①都市計画道路 16m

②片側歩道付道路 10.5m



ご清聴ありがとうございました。

木更津市 環境部 火葬場建設準備室



【連絡先】

電話 0438-36-1520

E-mail kaso@city.kisarazu.lg.jp
